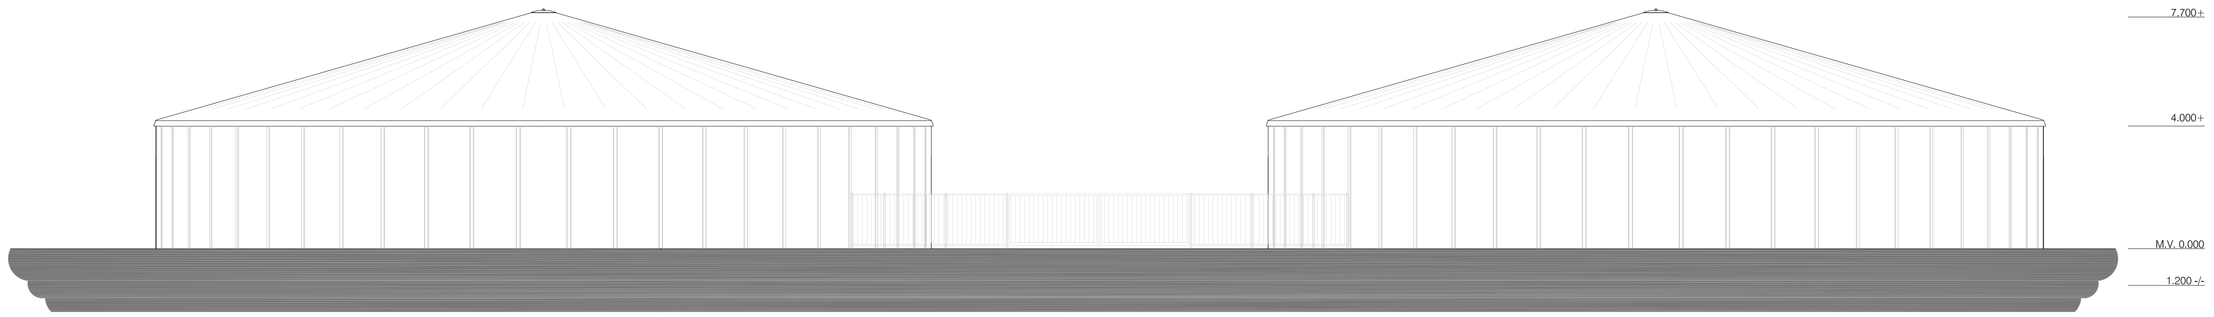

Aanzicht

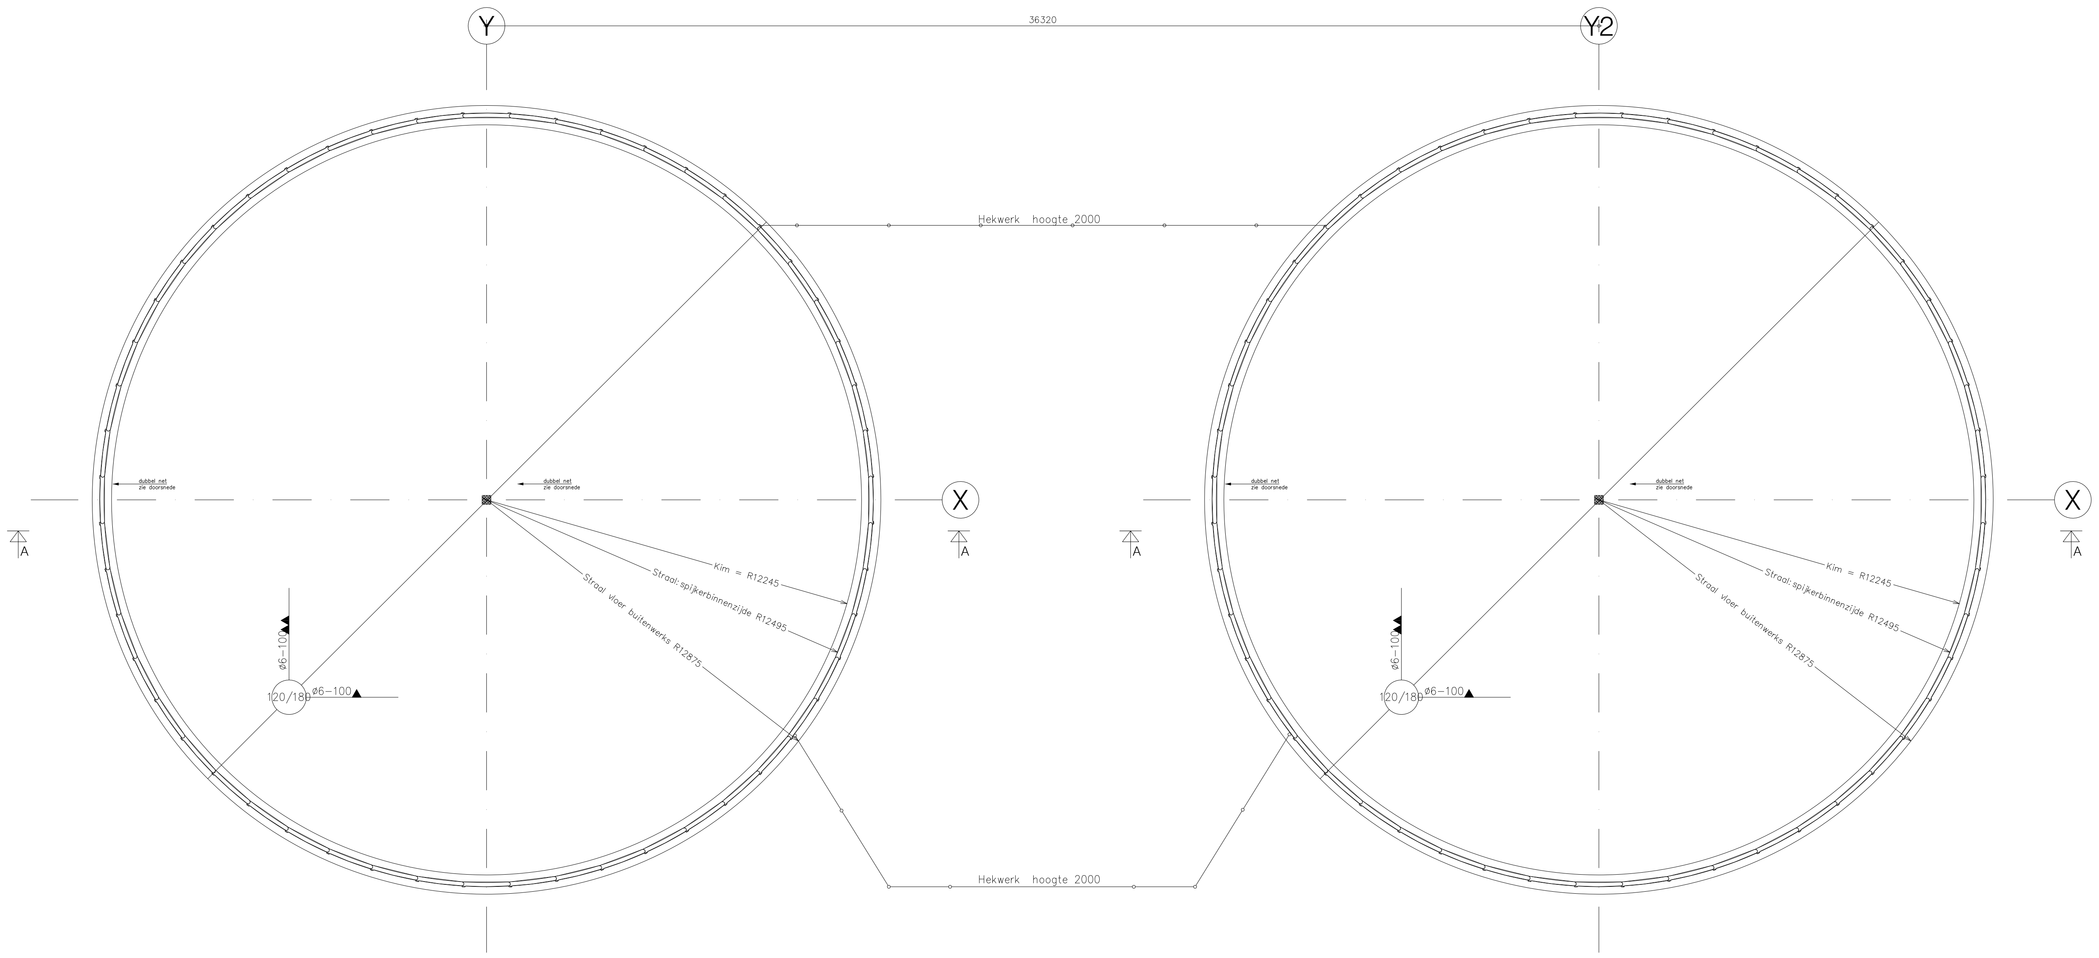

Bovenaanzicht silo: 52 A7 elementen - 5m
Inhoud mestsilo 2450 m3

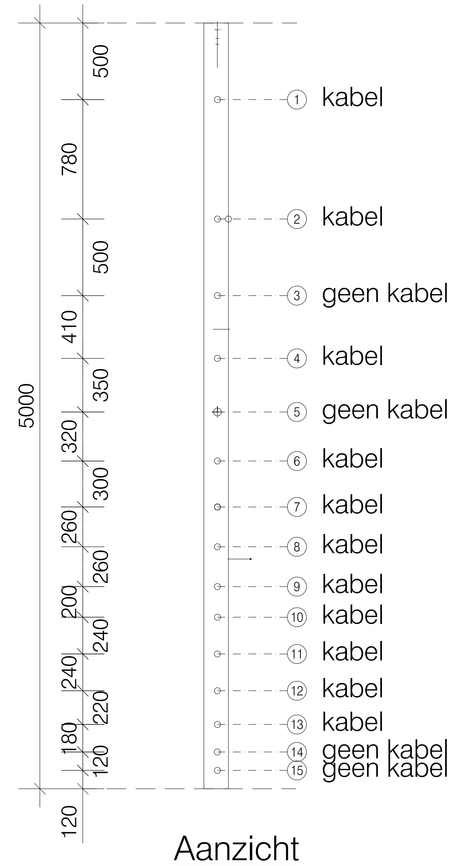

Aanzicht

(posities spankabels 52 el.)

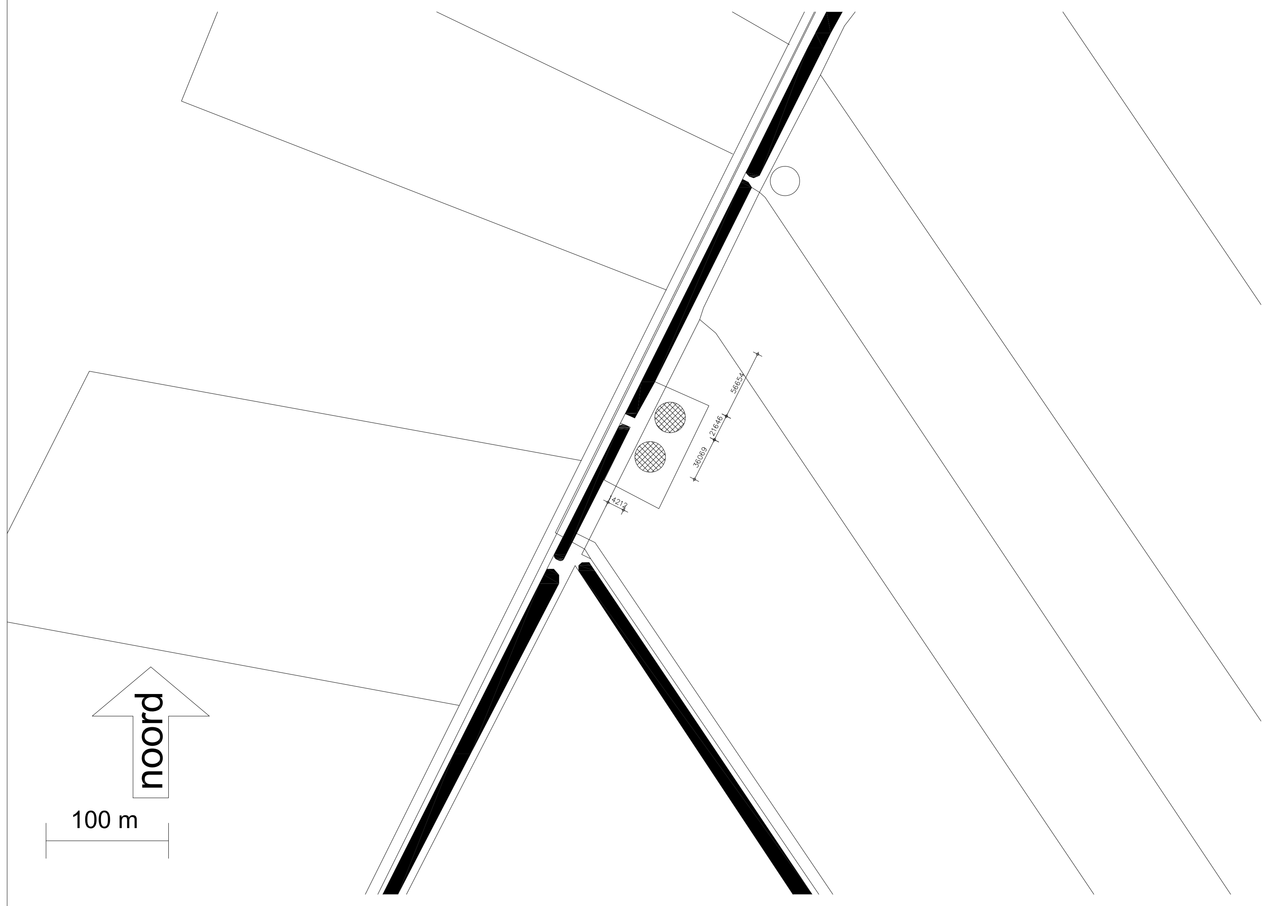

Situatie 1:2500

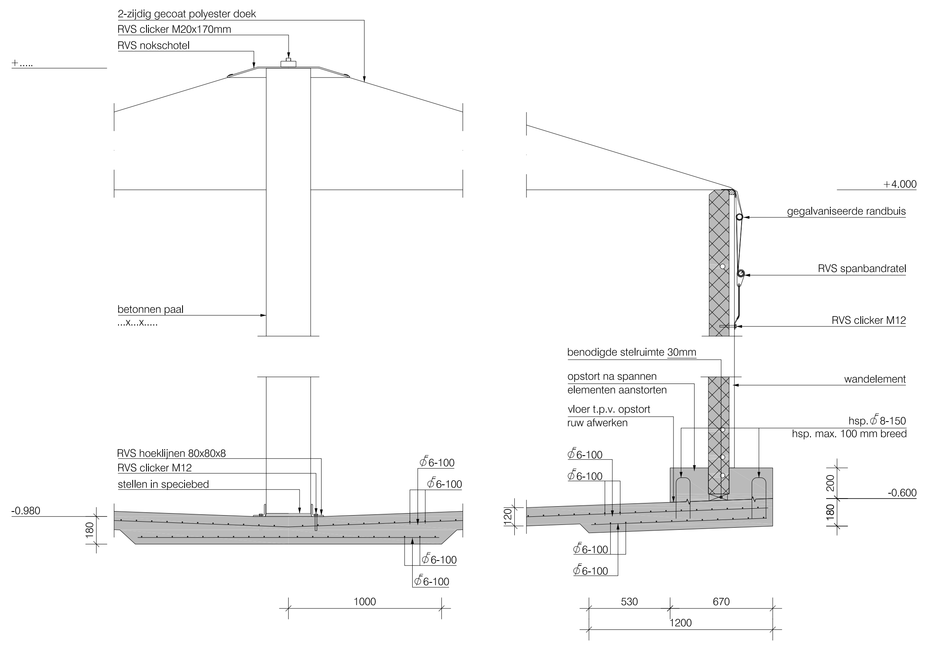

Details

Materiaalstaat

Wandelementen: beton, grijs, houtnerfmotief
Silokap: PVC gecoat polyesterweefsel halfmat zilvergrijs RAL 7040
Hekwerk: thermisch verzinkt stalen spijlenhekwerk, hoogte 2,0 meter

Uitvoering Silo's

Uitvoering van de silo's volgens KIWA/KOMO Cert. nr. K88995/01

Spanvolgorde

Spanvolgorde en montagespanning conform spanprotocol

Betonconstructies

Sterkteklasse i.h.w. gestort beton: C28/35
Staalkwaliteit: B500B
Milieuklasse: XC4, XD2, XA2

Dekking:	onderdeel	onder	boven	zijkant
	vloer	50	50	35
	kolom	35	35	35

Minimale laslengte:				
	ø 6 - 250mm	(onder + boven)	uitvoering volgens:	NEN-EN 206-1
	ø 8 - 300mm	(onder + boven)		NEN 8005 (nl)
	ø 10 - 400mm	(onder + boven)		NEN 6722 (nl)
	ø 12 - 500mm	(onder + boven)		NEN 6008 (nl)

Onder alle met de grond in aanraking komende betonvlakken een werkvloer van folie aanbrengen

Maatvoering in mm
Peilmaten in mm ten opzichte van peil
Maatvoering in het werk controleren

Bouwlocatie:

Veldkavel zonder nummer (52°51'32.05"N 6°57'52.75"O)
Vledders
7831 ?? Nieuw-Weerdinge

revisie	datum:
b	02092016
a	25072016

AquaStruct
Beneluxweg 13 4904 SJ Oosterhout
Tel:085 5006699 info@aquastruct.nl

Project: Mestsilo's MTS Middendorp-Stel
Onderdeel: Montageoverzicht
tekenaar: JvSi | datum: 17-3-2016 | blad no.
schaal: var. | project no.: 16004 | M001
